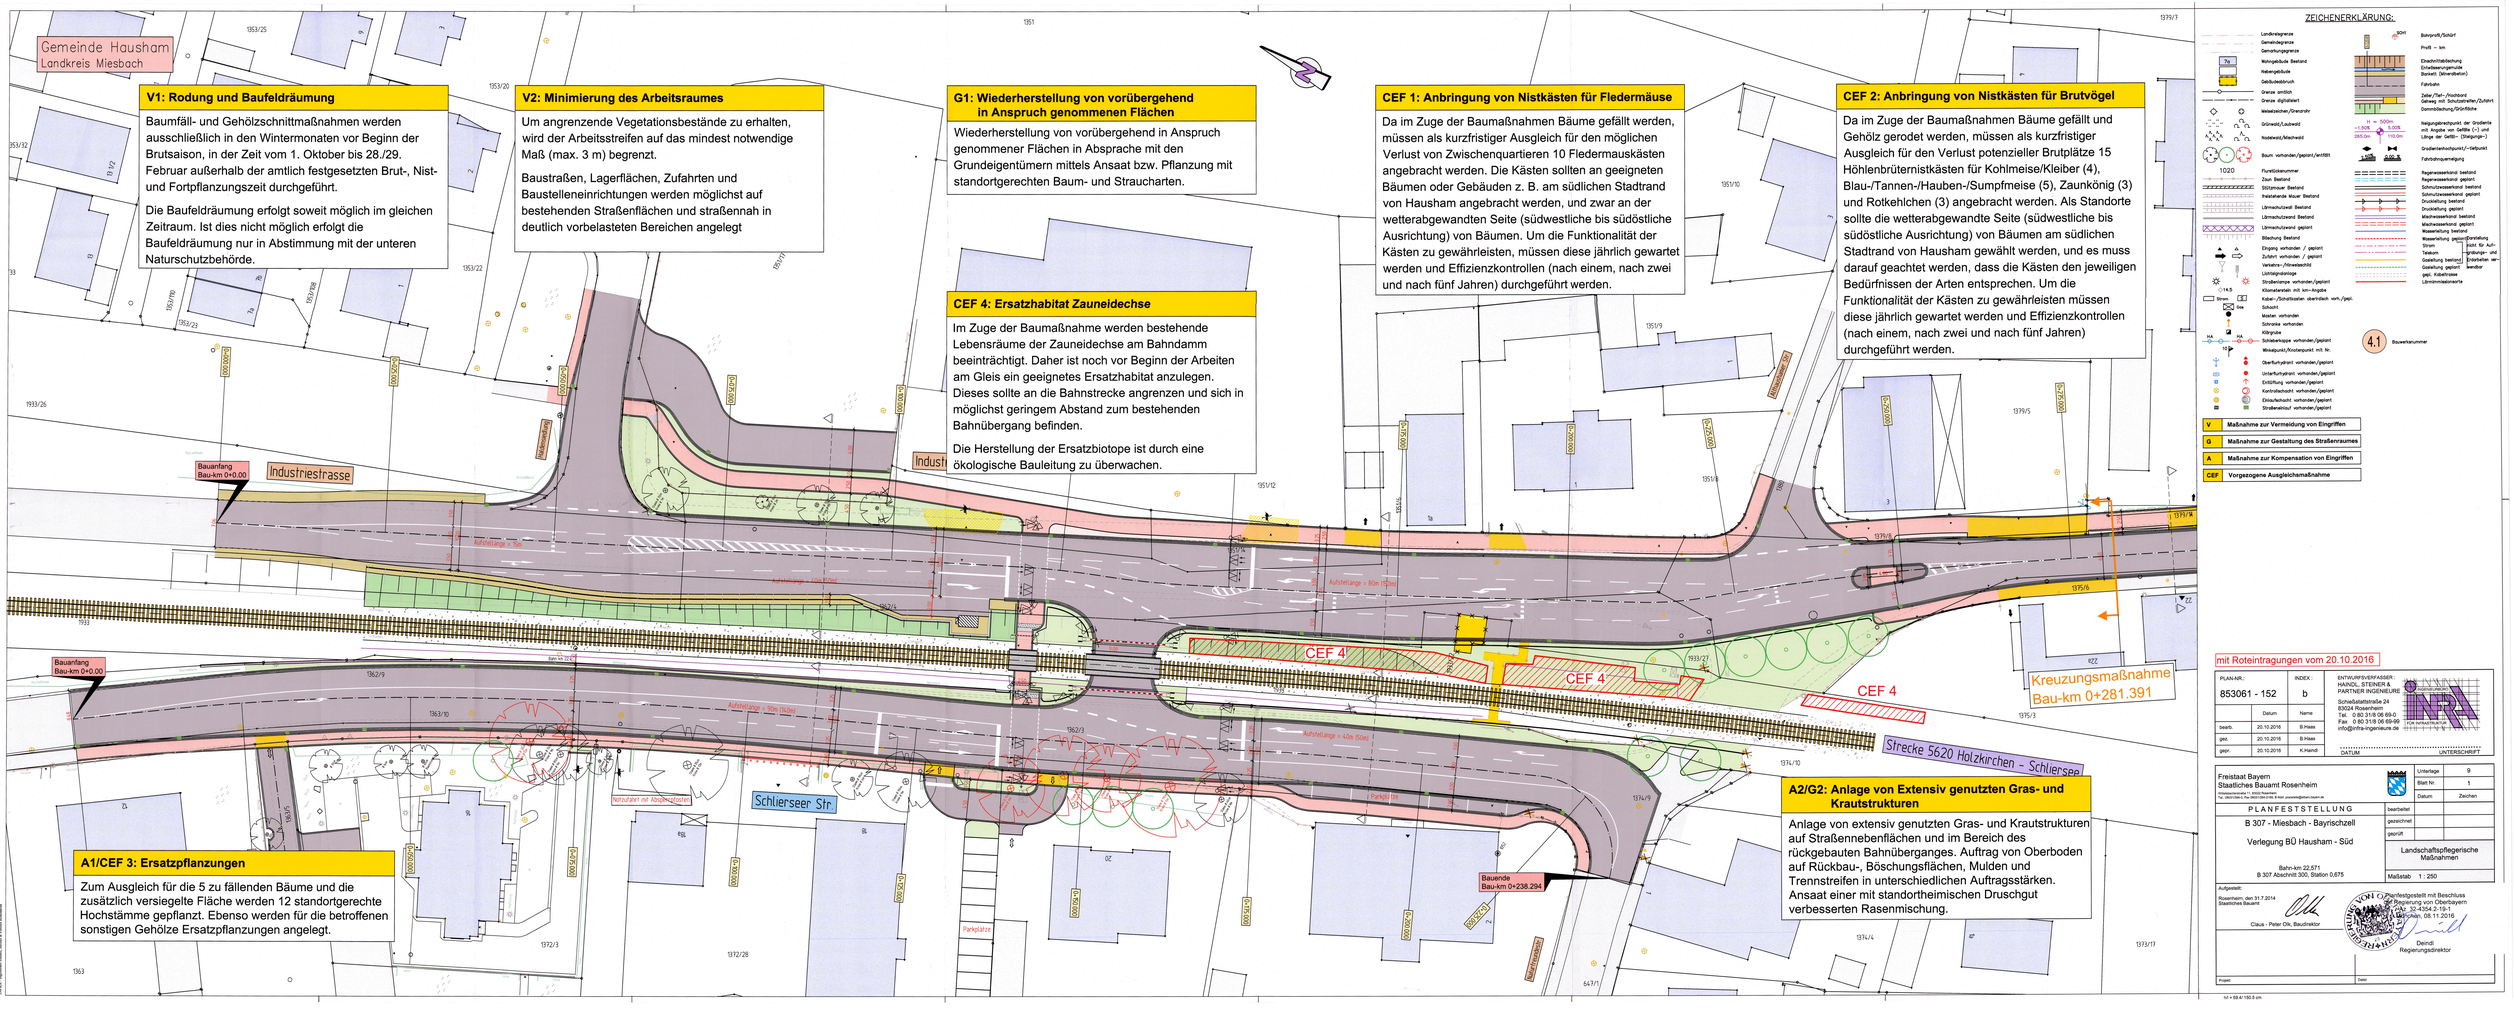
Gemeinde Hausham
Landkreis Miesbach
V1: Rodung und Baufeldräumung
Baumfäll- und Gehölzschnittmaßnahmen werden ausschließlich in den Wintermonaten vor Beginn der Brutsaison, in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der amtlich festgesetzten Brut-, Nist- und Fortpflanzungszeit durchgeführt.
Die Baufeldräumung erfolgt soweit möglich im gleichen Zeitraum. Ist dies nicht möglich erfolgt die Baufeldräumung nur in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde.
V2: Minimierung des Arbeitsraumes
Um angrenzende Vegetationsbestände zu erhalten, wird der Arbeitsstreifen auf das mindest notwendige Maß (max. 3 m) begrenzt.
Baustraßen, Lagerflächen, Zufahrten und Baustelleneinrichtungen werden möglichst auf bestehenden Straßenflächen und straßennah in deutlich vorbelasteten Bereichen angelegt
G1: Wiederherstellung von vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen
Wiederherstellung von vorübergehend in Anspruch genommener Flächen in Absprache mit den Grundeigentümern mittels Ansaat bzw. Pflanzung mit standortgerechten Baum- und Strauchar ten.
CEF 4: Ersatzhabitat Zauneidechse
Im Zuge der Baumaßnahme werden bestehende Lebensräume der Zauneidechse am Bahndamm beeinträchtigt. Daher ist noch vor Beginn der Arbeiten am Gleis ein geeignetes Ersatzhabitat anzulegen. Dieses sollte an die Bahnstrecke angrenzen und sich in möglichst geringem Abstand zum bestehenden Bahnübergang befinden.
Die Herstellung der Ersatzbiotope ist durch eine ökologische Bauleitung zu überwachen.
CEF 1: Anbringung von Nistkästen für Fledermäuse
Da im Zuge der Baumaßnahmen Bäume gefällt werden, müssen als kurzfristiger Ausgleich für den möglichen Verlust von Zwischenquartieren 10 Fledermauskästen angebracht werden. Die Kästen sollten an geeigneten Bäumen oder Gebäuden z. B. am südlichen Stadtrand von Hausham angebracht werden, und zwar an der wetterabgewandten Seite (südwestliche bis südöstliche Ausrichtung) von Bäumen. Um die Funktionalität der Kästen zu gewährleisten, müssen diese jährlich gewartet werden und Effizienzkontrollen (nach einem, nach zwei und nach fünf Jahren) durchgeführt werden.
CEF 2: Anbringung von Nistkästen für Brutvögel
Da im Zuge der Baumaßnahmen Bäume gefällt und Gehölz gerodet werden, müssen als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust potenzieller Brutplätze 15 Höhlenbrüternistkästen für Kohlmeise/Kleiber (4), Blau-/Tannen-/Hauben-/Sumpfmeise (5), Zaunkönig (3) und Rotkehlchen (3) angebracht werden. Als Standorte sollte die wetterabgewandte Seite (südwestliche bis südöstliche Ausrichtung) von Bäumen am südlichen Stadtrand von Hausham gewählt werden, und es muss darauf geachtet werden, dass die Kästen den jeweiligen Bedürfnissen der Arten entsprechen. Um die Funktionalität der Kästen zu gewährleisten müssen diese jährlich gewartet werden und Effizienzkontrollen (nach einem, nach zwei und nach fünf Jahren) durchgeführt werden.
A1/CEF 3: Ersatzpflanzungen
Zum Ausgleich für die 5 zu fällenden Bäume und die zusätzlich versiegelte Fläche werden 12 standortgerechte Hochstämme gepflanzt. Ebenso werden für die betroffenen sonstigen Gehölze Ersatzpflanzungen angelegt.
A2/G2: Anlage von Extensiv genutzten Gras- und Krautstrukturen
Anlage von extensiv genutzten Gras- und Krautstrukturen auf Straßennebenflächen und im Bereich des rückgebauten Bahnüberganges. Auftrag von Oberboden auf Rückbau-, Böschungsflächen, Mulden und Trennstreifen in unterschiedlichen Auftragsstärken. Ansaat einer mit standortheimischen Druschgut verbesserten Rasenmischung.
Bauanfang Bau-km 0+0.00
Industriestrasse
Aufstellfläche
Aufstellfläche
Aufstellfläche
